ホテル予約サイト
バカンス簡単ブッキング 47
（www.VKB47.com）

ソフトウェア全体テスト計画書

WEB-MTP-SW-VKB47-001

Ver.1.0.0

20XX/4/1

改版履歴

Version	作成日	作成者	説明	承認者
1.0.0.	20XX/4/1	山田太郎	初版	斉藤

目次

1.1 本書の識別番号.....1
1.2 本書の目的.....1
1.3 本書の対象製品.....1
1.4 参考文献.....2
2.1 テストの目的.....3
3.1 ハードウェア・テストアイテム.....4
3.2 ソフトウェア・テストアイテム.....5
3.3 テストアイテムの調達.....5
4.1 テスト工程.....6
4.2 テストフェーズ.....6
4.3 品質目標との関連.....8
4.4 テスト管理項目.....8
5.1 テストの重点項目.....9
6.1 テスト対象.....10
6.2 テスト非対象.....10
7.1 テスト判定結果の分類.....11
7.2 不具合報告の分類.....11
8.1 テスト管理指標.....12
8.2 テストの開始条件.....12
8.3 テストの終了条件.....13
8.4 テストの中断と再開条件.....14
9.1 テストドキュメント一覧.....16
10.1 テスト環境構成図.....17
10.2 作業場所.....18
11.1 人員構成図.....19
11.2 役割と責任.....20
12.1 テスト実施のスケジュール.....21
12.2 スケジュール明細.....22
13.1 会議体.....23
13.2 コミュニケーションの種類.....23
13.3 リスク発生時のコミュニケーション方針.....24
14.1 予見できるリスクとその対応.....25

1 本書について

本プロジェクトの概要は以下の通りである。

1.1 本書の識別番号

本書の識別番号は「WEB-MTP-SW-VKB47-001」である。

1.2 本書の目的

本書が対象とするソフトウェアシステムについて、ユーザーの利用環境において適切に動作し、ユーザーが期待する要求を充足し、本ソフトウェアシステムをユーザーが利用することで、より快適な生活が実現されるかを確認するための、テストの基本方針を示す文書である。

1.3 本書の対象製品

・システムの種別：ホテル予約サイト

・システムの名称： 日本語表記　バカンス簡単ブッキング47

英語表記	Vacance Kantan Booking 47
略称	VKB47
URL	www.VKB47.com

“47”は都道府県の総数に由来し、日本全国のホテルを取り扱っていることを意味している。以下、本書ではVKB47.comという。

・システムの概要：

VKB47.comは、インターネットに接続されたPCのWEBブラウザを利用することで、VBシステムに登録されている日本全国のホテルを検索し、希望するホテルを予約することができる。

・システムの機能：

①ホテル検索→予約申込　　・予約確認→変更・取消

その他、システムの概要・要求事項は「バカンス簡単ブッキング 47 ソフトウェア要求定義書（WEB-RDD-SW-VKB47-001）」を参照する。

1.4 参考文献

本書は以下の文書を前提に記述されている。

文書識別番号	文書名	作成責任者
WEB-PMP-PD-VKB47-001	バカンス簡単ブッキング 47 開発プロジェクト計画書	斉藤
WEB-RDD-PD-VKB47-001	バカンス簡単ブッキング 47 製品システム要求定義書	斉藤
WEB-RDD-SW-VKB47-001	バカンス簡単ブッキング 47 ソフトウェア要求定義書	瀬戸
WEB-GRS-PD-COM-001	WEB システム開発共通用語集	瀬戸
WEB-STD-PD-COM-001	WEB システム開発共通仕様書	瀬戸

その他の管理標準・ガイドライン

- ドキュメント管理標準
- ソフトウェアテスト不具合管理標準
- セキュリティ管理標準

2 テストの目的

2.1 テストの目的

（1）要求カバレッジ

下記のドキュメントに記載されている要求を満たしていることを確認する。

・バカンス簡単ブッキング 47　製品要求定義書（WEB-RDD-PD-VKB47-001）

・バカンス簡単ブッキング 47　ソフトウェア要求定義書（WEB-RDD-SW-VKB47-001）

（2）機能カバレッジ

すべての機能が過不足なく実装されており、正しく機能することを確認する。

ただし、本計画書作成時点では「機能設計仕様書」が未作成であるため、機能カバレッジのテストの詳細は「個別（機能別）テスト計画書」に記載するものとする。

（3）留意ポイント

以下の事項に留意してテストを実施する。

・VKB47.com を運営するバルテス・トラベル社にとって、初めてのネットサービスであるため、本システムの品質により対面販売で築いてきた企業イメージが下がらないよう、重要度の低い不具合であっても、利用者の遭遇確率が高い不具合は対応すること。

・北米、欧州、アジア地域および日本在住の外国人の利用を想定しているため、それらの利用者が問題なく利用できる使用性であること。

・利用者が初めて VKB47.com にアクセスした際、疑問や不安を感じず、VKB47.com を利用するメリットを感じられる使用理解性であること。

3 テストアイテム

3.1 ハードウェア・テストアイテム

（１）サーバ

・開発用 WEB/AP サーバ　　・・・単体テスト、結合テスト

・テスト用 WEB/AP サーバ　・・・機能テスト

・本稼働用 WEB/AP サーバ　・・・システムテスト

・本稼働用メールサーバ　　・・・システムテスト

・本稼働用利用者 DB　　・・・システムテスト

・VB システムサーバ群　　・・・システムテスト

※メールサーバ、利用者 DB は機能テストまでは、WEB/AP サーバと同一マシンに環境構築する

（２）PC

・開発用 PC　・・・・・・・・・・単体テスト、結合テスト

・テスト用 PC ・・・・・・・・・・機能テスト、システムテスト

Windows　×２台（うち 1 台は無線 LAN 接続可能機器）

Mac OS X　×２台（Mac は全機種無線 LAN 標準対応）

（３）通信環境

・スイッチングハブ　　×１台

・無線 LAN アクセスポイント　×１台

・ADSL（12Mbps）相当の通信回線

3.2 ソフトウェア・テストアイテム

（１）WEB ブラウザ

Windows

- Internet Explorer 6, 7, 8
- Firefox 3.5, 3.6
- Safari 4.0, 5.0

Mac OS X

- Firefox 3.5, 3.6
- Safari 4.0, 5.0

（２）メールソフト

Windows、Mac　共通

- Gmail アカウント（WEB メール）
- Yahoo! Japan アカウント（WEB メール）
- Windows Live アカウント（WEB メール）

Windows

- Outlook Express（Windows メールアプリケーション）
- Windows メール（Windows メールアプリケーション）

Mac

- Mail.app（Mac メールアプリケーション）

3.3 テストアイテムの調達

テストアイテムはすべて、以下の部署から無償で貸与される。

・開発用サーバ　：VKB47.com　ソフトウェア開発チーム

・テスト用サーバ：WEB システム開発部　ファシティ管理部

・本稼働用サーバ：WEB システム営業部

使用期間、数量などの申し入れは、テスト計画時および利用開始日の 15 稼働日前にソフトウェア開発チームから行う必要がある。

4 テストの概要

4.1 テスト工程

本プロジェクトにおけるテスト工程は以下の６工程で構成される。

（１）全体テスト計画

（２）個別テスト計画

（３）テスト設計

・テスト設計仕様書作成　　・テスト項目作成　　・テストデータ作成

（４）テスト実施

（５）テスト終了判定

（６）テスト報告

※上記（３）～（６）は、上記（２）で定義したテスト計画別に遂行・管理する。

4.2 テストフェーズ

（１）テストフェーズの基本方針

テストフェーズ	テストフェーズの基本方針	実施担当
単体テスト	単体テストはモジュール単位での正常動作を確認する。 本システムでは各画面の機能のほか、WEB ブラウザの「戻る」「進む」「再読込」など、画面内のリンクによらない遷移のテストを行う。	ソフトウェア開発チーム（※１）
結合テスト	結合テストはモジュール同士を組み合わせた際のモジュール間のインタフェースに注目して正常動作を確認する。 画面遷移前後で情報がすべて引き継がれることを確認する。	ソフトウェア開発チーム（※１）
機能テスト	機能テストは、単機能、および２機能間の組合せテストを行う。 本システムでは画面遷移の遷移時間に注目してテストを行う。 各画面内の情報項目、デザインについてはここで確定しておくことが必要。	ソフトウェア開発チーム(※2) ソフトウェアテストチーム
システムテスト	システムテストは要求定義書に則して行う。 IPA「安全なウェブサイトの作り方」のチェックリストの確認を行う。	ソフトウェアテストチーム

※１　単体テスト、結合テストに関する詳細事項は、ソフトウェア開発チームで策定される。

※２　ソフトウェア開発チームは機能テストのうち、基本機能動作確認テストのみ行う。

（2）テストフェーズの詳細

テストフェーズ		テスト種別		概要
1	単体テスト	1	プログラム制御パス・テスト（ロジック・パステスト）	プログラム内の条件分岐などに注目をしてパスが通っているかを確認。レビューによるソースコードの確認も有効である。
		2	単機能動作確認テスト	モジュール単体の動作確認を行う。
		3	下位インタフェース確認テスト	下位モジュールとの値の受け渡しや起動の確認を行う。スタブを用いたインタフェースの確認を行う。
2	結合テスト	1	モジュール間インタフェース確認テスト	モジュール間の値の受け渡しや起動の確認を行う。
		2	データフローテスト	データの流れにもとづいてテストすべきパスの確認を行う。
3	機能テスト	2	画面遷移テスト	画面遷移図をもとに正しく状態の遷移をするかの確認を行う。
		3	基本機能動作確認テスト	システムの基本的な機能について動作させて結果を確認する。
		4	入力バリエーション・テスト	パターン化されたシステムへの全入力値与えて動作を確認する。
		5	障害時動作確認テスト	想定されるすべての障害に対するシステムの挙動を確認する。
		7	機能パフォーマンステスト	求められる処理速度が実現されているか測定する。
3	システムテスト	1	障害復旧手順確認テスト	想定される全障害について、復旧手順が正しい事を確認する。
		2	負荷テスト	システムに負荷がかかった場合の動作を確認する。
		3	機密管理要件確認テスト	求められる機密管理の基準を満たしていることを確認する。
		4	システムパフォーマンステスト	求められる処理速度が実現されていることを測定する。
		5	正常時運用確認テスト	正常時運用（“このサイトの使い方”の操作）を実施し、その挙動が正しい事を確認する。
		6	ユーザビリティ・テスト	利用者の特性に則して、問題点を洗い出す。
		7	入力操作確認テスト	システムに関する各種の入力操作を実行し、その処理結果を確認する。
		8	構成テスト	機器、S／W、ネットワーク構成を変更した時の動作を確認する。

4.3 品質目標との関連

「バカンス簡単ブッキング 47 開発プロジェクト計画書（WEB-PMP-PD-VKB47-001）」に定められた「品質保証の体制」と上記テストフェーズとの関係を示す。

分類		単体テスト	結合テスト	機能テスト	システムテスト
品質特性	機能性	－	－	－	○
	信頼性	－	－	－	○
	使用性	○	－	－	○
	効率性	－	－	○	－
	保守性	－	－	－	○
	移植性	○	－	－	－
利用時品質	有効性	－	－	○	○
	生産性	－	－	○	○
	安全性	－	－	－	○
	満足性	○	－	－	○

4.4 テスト管理項目

（１）テスト計画カバレッジ（要求、機能）

（２）テスト設計カバレッジ（要求、機能）

（３）テスト項目カバレッジ（要求、機能）

（４）テスト項目数（作成、実施）

（５）不具合報告数（報告項目の内訳）

（６）テスト工数

※上記（４）～（６）は、個人別に収集し、集計して全体を管理する。

5 アプローチ

5.1 テストの重点項目

個別のテストのアプローチについては、「個別（機能別）テスト計画書」に記載するものとする。

ただし、下記の事項については、特に重要確認項目として、テスト全体を通して意識すること。

（1）検索の品質

ホテル検索が短時間で正確に行われること。

ホテル検索中の画面の工夫により待ち時間を感じさせないこと。

検索結果一覧から求めるホテル（客室）が選択できること。

（2）キーボード入力を必要としない操作性

予約申込での情報入力を除き、キーボード操作が最低限におさえられていること。

（3）英語ページ

北米、欧州、アジア地域および日本在住の外国人が利用可能であること。

たんに英語表記されているだけでなく、用語、表記など社会的慣習に配慮した表記であること。

（4）VB システムとの連動

VKB47.com が VB システムに影響を与えないこと。（VB システムの DB を更新する際に、異常処理を考慮したテストを行う）

6 テスト対象

6.1 テスト対象

・ソフトウェアで実現される VKB47.com のすべての機能

・VKB47.com で更新する情報を利用する VB システム内の機能

6.2 テスト非対象

・VB システムに依存する品質

VB システムの DB 内の情報の品質（正確性、整合性など）

VB システムの性能

・トップページに表示されるキャンペーン情報などの品質

ただし、これらの不備を発見した場合は、ソフトウェアテストで検出した不具合と同じ手順で不具合報告を行う。

7 判定基準

7.1 テスト判定結果の分類

「ソフトウェアテスト実施標準」の通りとする。

代表的なものを以下に示す。

・OK

・NG

・不可・・・・・他のテスト項目が OK にならなければ実施できない項目

ブロック要因となっているテスト項目 ID を備考欄に記述しておくこと。

・（空白）・・・テスト未実施の項目

7.2 不具合報告の分類

「ソフトウェアテスト不具合管理標準」の通りとする。

代表的なものを以下に示す。

・重要度（利用時における重み付け）×５段階

「ソフトウェアテスト不具合管理標準」を参照

・優先度（開発時における重み付け）×５段階

「ソフトウェアテスト不具合管理標準」を参照

・影響度（不具合修正時にどこまで影響するかの影響度）×３段階

・単一機能レベル

・複数機能レベル

・要求レベル

・遭遇確率（利用者が不具合に遭遇する確率）×４段階

・製品を使用するすべての利用者

・その機能をデフォルト設定で使用する利用者

・その機能の設定を変更して使用する利用者

・ごくわずかな利用者

8 テストの開始・終了条件

8.1 テスト管理指標

・テスト実施率（＝実施済テスト件数／テスト項目総数）

日次でテスト実行率を管理する。テストの実施率が滞っている場合、その原因を優先的に処置する必要がある。

・不具合検出率（＝不具合検出数／実施済テスト項目数）

実行したテスト件数のなかで発見された不具合数の割合を管理する。この値が高い場合、内容によっては、さらにテストを追加する必要があり、次のテストフェーズのテスト実施に移行しないこともある。

また、必要であれば、機能（モジュール）等に重要度や優先度といった重み付けを行ない、重み順にエラー発見率を管理する。エラー発見率の採用／不採用は、ソフトウェア開発チーム内で検討する。

・不具合収束率

テスト実施期間単位（週毎、日毎など）に対して、検出された不具合件数の収束率を管理する。

一般的には、テスト実施期間の初期において不具合件数が多く（不具合率が高く）、時間が経過するにつれて、発見される不具合件数が少なって（不具合率が低くなって）いく。

・不具合密度（＝機能別不具合検出数／実行済テスト項目数）

ある特定の機能（モジュール）に不具合が集中していないかを管理する。

8.2 テストの開始条件

（1）テストプロジェクトの開始条件

レビュー

全体テスト計画書（本文書）がテストリーダー、ソフトウェア開発チームマネージャ、環境構築マネージャによるレビューを受け、指摘事項がすべて対応（対応しないことが合意）されていること。

承認

全体テスト計画書（本文書）がプロジェクトマネージャにより承認されていること。

（2）テスト実施の開始条件

単体テスト：

ソースコードレビューが完了していること。

制御フローを作成し、制御パスカバレッジの算出が完了していること。

作成済かつテスト済のスタブ、ドライバが作成済であること。

結合テスト：

単体テストが完了しており、検出された不具合がすべて解決していること。

結合インタフェースの仕様変更の可能性が低いこと。

機能テスト：

機能テスト単位で、単体テスト、結合テストが完了しており、検出された不具合がすべて解決していること。

テスト用環境が構築できていること。

テスト計画書、テスト設計書が承認されていること。

テスト項目のレビューが完了していること。

システムテスト：

全機能一式の機能テストが完了していること。

本稼働用環境が構築できていること。

次工程移行判定会議の判定結果が「移行可」であること。

テスト計画書、テスト設計書が承認されていること。

テスト項目のレビューが完了していること。

8.3 テストの終了条件

（1）テストプロジェクトの終了条件

個別テストの終了条件を満たしていること。

リハーサルを兼ねた最終テスト（機能テスト・システムテストのテスト項目から基本セットを抽出したもの）で不具合検出が 0 件であること。

実現するとした要求項目（ソフトウェア要求定義）をすべて満たしていること。

実現するとした機能（機能設計仕様）がすべて実装されていること。

（2）テスト管理指標によるテストフェーズの終了条件

「8.1 テスト管理指標」について、個別テスト計画で終了条件を定める。

計画値と実績値を日々対比して管理し、数値の達成だけではなく、その傾向を把握、分析した上で、テスト終了を判断する。

原則としては、

単体テスト、結合テスト・・・・・テスト項目の消化を重視

機能テスト、システムテスト・・・不具合の収束状況を重視

（3）不具合分類によるテストフェーズの終了条件

重要度の「高い」不具合について、ソフトウェアテスト不具合管理標準に基づき、すべて「解決済み」であること。

「やや高い」不具合について、すべて「解決済み」の目処がついていること。

不具合分類		各テスト工程の終了基準（原則）
重要度	高い	発見されたすべての不具合が修正されており、該当する不具合の解決確認および影響を受けると判断されたテスト項目の再確認が終了していること。
	やや高い	発見されたすべての不具合が修正されており、解決確認が実施されていること。また、不具合修正の影響を受けると判断されたテスト項目の再確認が計画されていること。
	普通	発見された不具合がすべて修正されているか、または修正の目処が立っていること。
	やや低い	発見された不具合の 80%が修正されており、修正されていない 20%についても修正の目処が立っていること。
	低い	発見された不具合のすべての不具合がプロジェクトマネージャに報告され、認知されていること。
優先度	高い	発見されたすべての不具合が修正されており、該当する不具合の解決確認が終了していること。
	やや高い	発見されたすべての不具合が修正されていること。または解決確認が終了しているか、近日中に計画されていること。
	普通	発見された不具合がすべて修正されているか、または修正の目処が立っていること。
	やや低い	発見された不具合の 80%が修正されており、修正されていない 20%についても修正の目処が立っていること。
	低い	発見された不具合のすべてについてプロジェクトマネージャに報告され，認知されていること。
その他		問題点が不具合管理票など記録に残る媒体で報告され、テスト側と開発側双方で問題の内容が確認されていること。

8.4 テストの中断と再開条件

（1）中断と再開の判定

「プロジェクト定例会議」での協議を受け、プロジェクトマネージャが中断・再開の判定を下す。

テストの中断条件に関わる事項は「進捗報告」により報告を受けたテストマネージャが「プロジェクト定例会議」で報告する。

再開に向けた解決方法は、「プロジェクト定例会議」で協議され、責任者と期限を定めるものとする。

（２）中断条件

- 前工程の終了条件が満たされていないと判断される場合。
- 当該テストフェーズで検出した不具合のうち、前テストフェーズまでに検出しておくべき不具合が 10%以上となった時。
- 未解決の不具合のうち、検出から 10 稼働日以上経過している不具合が 30%を超えた時。
- テスト実施において、テストチーム全体で 3 稼働日以上の遅延が発生し、遅延解消の目処が 5 稼働日以上たたない時。

（３）再開条件

- 5 稼働日以内に中断条件が解消されること。
- 再発の可能性が低いと認められること。

9 テストドキュメント

9.1 テストドキュメント一覧

ドキュメント名（※１）	作成者	レビュー者	承認者
ソフトウェア全体テスト計画書（本書）	テストマネージャ	・プロジェクトマネージャ ・ソフトウェア開発マネージャ ・環境構築マネージャ ・テストリーダー ・他システムのソフトウェア開発チームマネージャ、テストチームマネージャ	プロジェクトマネージャ
ソフトウェア個別（機能・システム）テスト計画書	テストリーダー	・テストマネージャ ・開発チームマネージャ ・他システムのソフトウェア開発チームマネージャ、テストチームマネージャ	テストマネージャ
ソフトウェア個別（機能・システム）テスト設計書	テストリーダー	・テストマネージャ ・開発チームマネージャ ・他システムのテストチームマネージャ	テストマネージャ
ソフトウェアテスト項目書	テストメンバー	・テストリーダー ・作成者以外のテストメンバー	テストマネージャ
ソフトウェアテスト手順書	テストメンバー	・テストリーダー ・作成者以外のテストメンバー	承認不要
ソフトウェアテストデータ定義書	テストメンバー	・テストリーダー ・作成者以外のテストメンバー	承認不要
ソフトウェアテスト実施結果	テストメンバー	テストリーダー	テストマネージャ
ソフトウェアテストログ	テストメンバー	テストリーダー	承認不要
不具合報告書	テストメンバー	テストリーダー	プロジェクトマネージャ（※２）
ソフトウェア個別（機能別）テストレポート	テストリーダー	テストマネージャ	テストマネージャ
ソフトウェア個別（機能別）テスト全体レポート	テストマネージャ	テストリーダー	プロジェクトマネージャ

※１　ドキュメントのフォーマットは「ドキュメント管理標準」を参照。

※２　BTS（不具合管理システム）の管理責任者

10 テスト環境

10.1 テスト環境構成図

（1）単体テスト・結合テスト

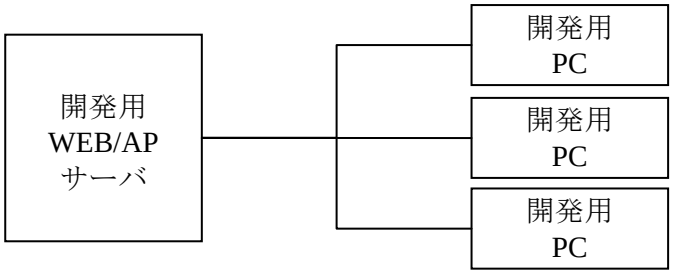

（2）機能テスト

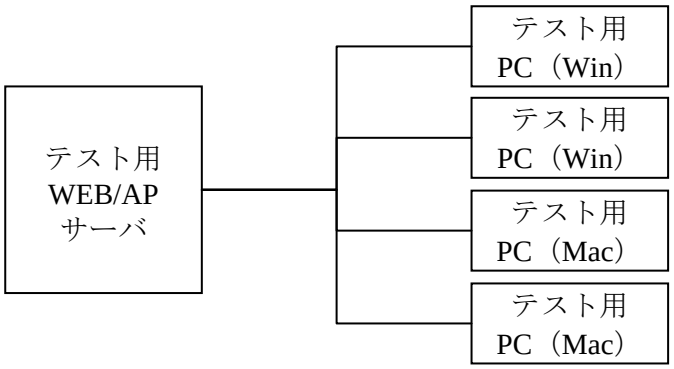

（3）システムテスト

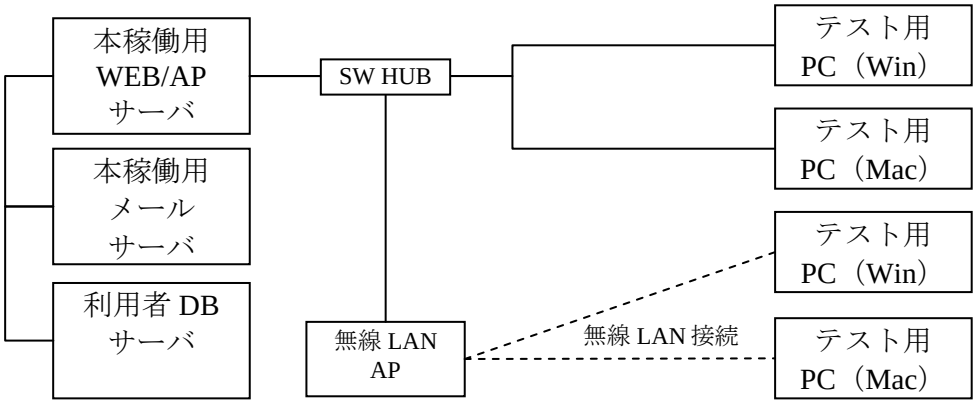

※各機材の調達については、本書「テストアイテム」を参照のこと。

10.2 作業場所

（1）開発内テスト・機能テスト

WEB システム開発部内 VKB47.com 開発プロジェクトの作業スペースにて実施する。

（2）システムテスト

本稼働用サーバの VB システムサーバ室（外部データセンター）の設置に合わせて、バルテス・トラベル社情報システム部の作業スペースにて実施する。

11 人員構成

11.1 人員構成図

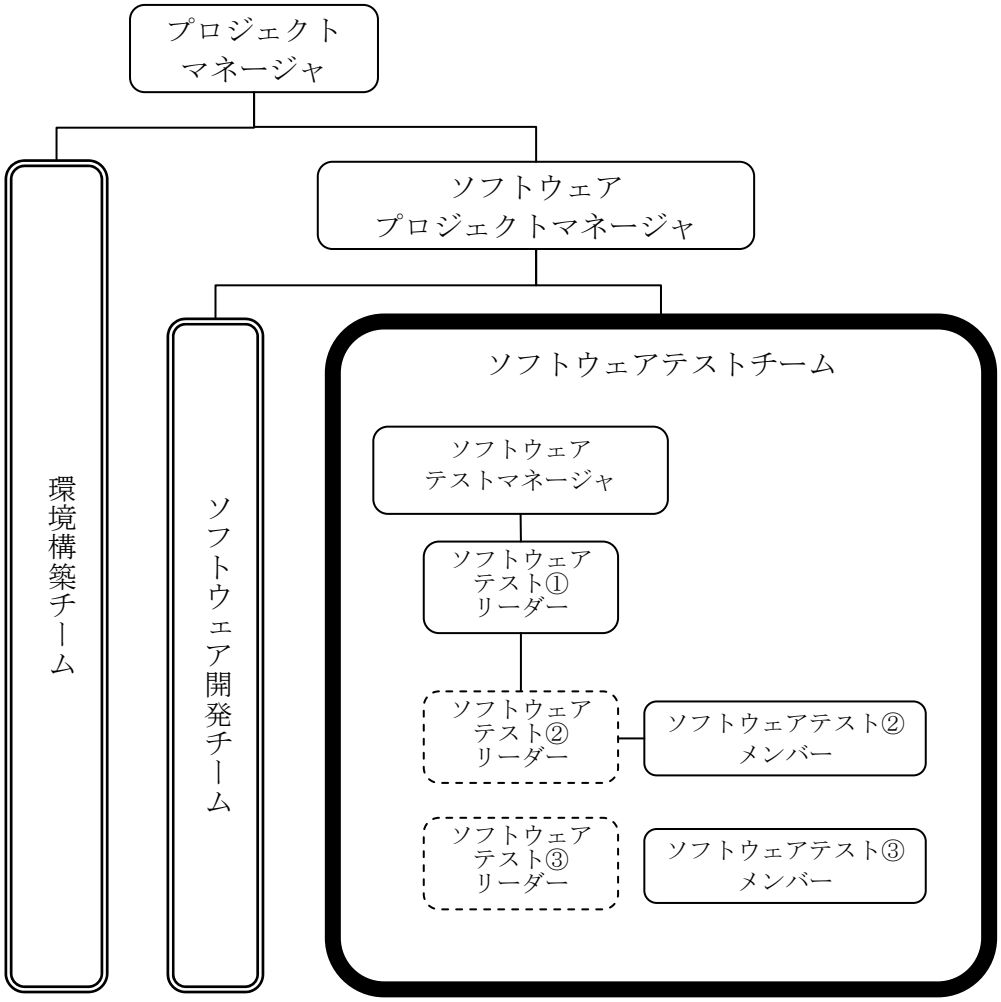

・ソフトウェアテスト①チーム：機能（ホテル検索・予約申込）

・ソフトウェアテスト②チーム：機能（予約確認・変更取消）

・ソフトウェアテスト③チーム：ローカライズ、セキュリティ

本テストでは特に技術的な新規性、専門性は必要としない。

11.2 役割と責任

役割	タスク	担当
ソフトウェアテスト マネージャ （テスト経験５年。うち WEB システムのテスト管理経験２年程度）	ソフトウェアテスト全体計画書作成 テスト管理（品質） テスト進捗管理（全体） テスト機材調達 外部組織との渉外	1 名
ソフトウェアテスト リーダー （テスト経験３年。うち WEB システムのテスト管理経験１年程度）	機能テスト計画書・設計書作成 システムテスト計画書・設計書作成 テスト環境構築 不具合管理（BTS 運用含む）	1 名
ソフトウェアテスト メンバー （テスト経験１年程度。うち 1 名は WEB システムの開発プロジェクトに 2 プロジェクト以上参画したことのある人）	テスト項目書作成 テスト手順作成 テストデータ作成 テスト実施 不具合報告	2 名
ソフトウェア開発チーム	単体テスト計画書作成・実施 結合テスト計画書作成・実施	管理対象外

ただし、機能テスト、システムテストで実施する以下の３点についてはソフトウェアテストチーム以外の部署に依頼する。詳細な実施工数、時期は個別テスト計画書作成時に当該部署と調整の上、定めるものとする。

・負荷テスト：負荷テストツールのスペシャリスト

・テスト計画書、テスト設計書のレビュー：WEB システム開発部所属の他製品の開発チームマネージャ、テストチームマネージャ。

12 スケジュール

12.1 テスト実施のスケジュール

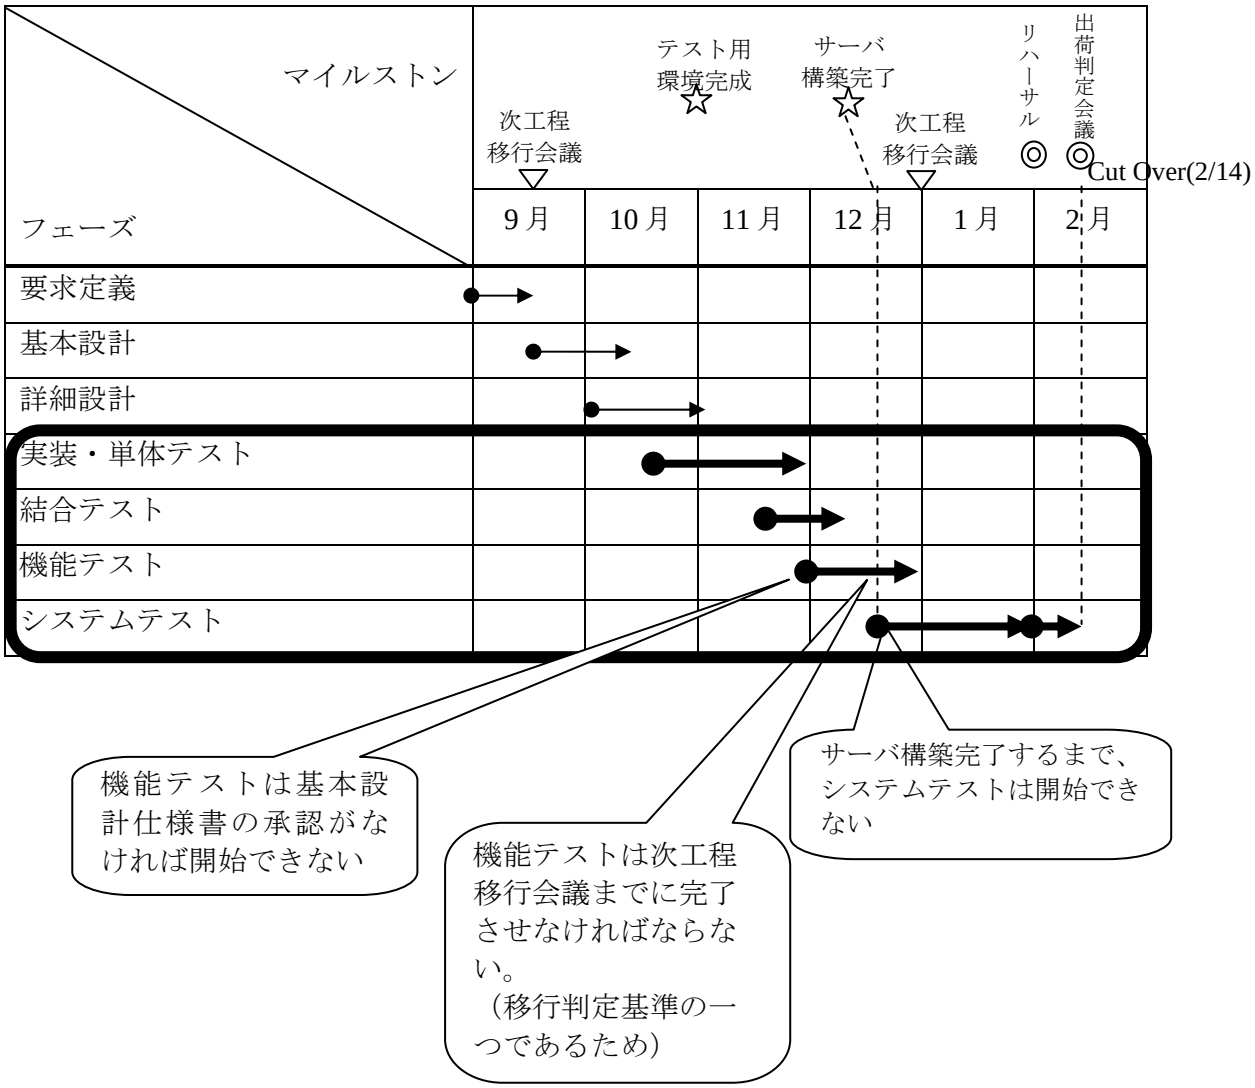

12.2 スケジュール明細

工程	開始日	終了日	工数（人日）	備考
単体テスト実施	2010/10/15	2010/11/30	—	開発チームで実施するため明細は省略
単体テスト終了判定	11/25	11/26	2.0	
結合テスト実施	2010/11/15	2010/12/15	—	開発チームで実施するため明細は省略
結合テスト終了判定	12/14	12/15	2.0	
機能テスト実施	2010/12/1	2010/12/26	—	
テスト計画	9/25	9/29	3.0	
テスト設計	10/14	10/20	5.0	
テスト項目･手順	10/21	10/31	12.0	
テスト環境設定	11/29	11/30	2.0	
テスト実施	12/1	12/26	31.0	
テスト終了判定	12/27	12/28	2.0	
システムテスト実施	2011/12/20	2011/2/13	—	
テスト計画	9/30	10/5	4.0	
テスト設計	10/21	10/31	7.0	
テスト項目･手順	11/1	11/28	18.0	
テスト環境設定	12/17	12/18	2.0	
テスト実施	12/20	2/10	48.0	
テスト終了判定	2/11	2/12	2.0	
		合計	140.0	

1 人日あたり 5 万円とし、140 人日×5 万円＝700 万円を、テスト全体の予算とする。

開発プロジェクト計画よりソフトウェアテスト予算は 800 万円。

残りの 100 万円はリスク事後対策や計画変更時に執行するための予備費として取りおくものとする。

13 コミュニケーションルール

13.1 会議体

会議体名称	実施頻度	主催	目的･権限	参加者
プロジェクト定例会議	2 週間に 1 回	プロジェクトマネージャ	品質評価決定機関 リスク対応	プロジェクトマネージャ、 開発チーム、テストチーム
テストチーム定例会議	週 1 回	テストマネージャ	テスト進捗会議	テストチーム
各機能担当チーム定例打合せ	日次	テストリーダー	各機能担当進捗会議	機能リーダー、機能テスト担当者
テスト機材調達会議	各テスト前	インフラ管理者	テスト環境チーム定例会	テストマネージャ、テストリーダー WEB システム開発部　ファシティ管理部

上記のほかプロジェクトレベルでは「次工程移行会議」「変更会議」が存在する。

詳細は「バカンス簡単ブッキング 47 開発プロジェクト計画書」（WEB-PMP-PD-VKB47-001）」を参照。

13.2 コミュニケーションの種類

（1）報告

下位から上位へのテスト管理上、公式性の高いコミュニケーション。

・進捗報告（経路／頻度／手段）

・メンバー→テストリーダー／日次／メール

・テストリーダー→テストマネージャ／日次／メール

・不具合報告

・プロジェクト関係者／随時／BTS

※詳細は「ソフトウェアテスト不具合管理標準」を参照。

（2）通達

上位から下位への計画・仕様の決定、変更、会議の開催、議事録の公開などに関する、公式性の高いコミュニケーション。

プロジェクトのファイルサーバーへ通達文書を公開し、公開したことをメールで連絡する。

（3）連絡

あらゆる事柄に関する公式性の低い双方向のコミュニケーション。

比較的、迅速性・緊急性が求められる場合に利用する。

テストチーム外との連絡の送受は、テストマネージャ、テストリーダー、または代理の指示を受けたテストチームメンバーのみが行うものとする。

プロジェクトで使用が認められている連絡手段を「セキュリティ管理標準」にて参照し、状況に適した手段を利用する。

（4）質問

テストの品質に影響する疑問は「質問」として取り扱う。不具合同様に、発生から解決までを BTS で管理する。

すべての質問は、解決されないかぎり進捗が停滞することから、迅速な解決が求められる。

テストリーダーは自身が担当するチームから発行された質問について、質問ステータス（BTS における不具合ステータス）が 5 日間以上変化していない場合は、そのことを進捗報告する。

テストマネージャはテストリーダーから受けた進捗報告に、質問解決状況の停滞が含まれていた場合、停滞の原因を解明し、対応を図る。

13.3 リスク発生時のコミュニケーション方針

プロジェクト中にリスクが発現した場合、次回の定例会議で処理すべきか、即時処理すべきかを判断すること。即時処理すべきリスクについては、主催者の権限により、緊急会議を開催する。

テストチーム内の会議であっても、必要に応じて開発チームへ会議への参加を、主催者より要請する。

各会議体レベルで判断できないリスクについては、上位の会議体へエスカレーションを行う。

テストチーム内で対応、解決したリスクであっても、その内容は「プロジェクト定例会議」で報告する。

14 予見できるリスクとその対応

14.1 予見できるリスクとその対応

（1）環境構築遅延の発生

リスク発生時の影響：

本稼働用サーバ環境の構築が遅延した場合は、システムテストを開始することができない。

リスク発生の可能性：

ハードウェアの入手について、サーバ機器は、年末の品薄期に入ることや、海外メーカーの工場直送品のため、生産、輸送に関してコントロールができないことから、リスク発生の可能性が高い。

リスクへの事前対策：

サーバなどを手配する WEB システム開発部・営業部に対し、プロジェクト定例会議を通じて、調達状況を確認する。

遅延が見込まれた場合は、入手先の変更や、代替機でのテスト環境構築を検討する。

（2）VB システムに対する負荷増大

リスク発生時の影響：

VKB47.com のアクセス数が想定以上だった場合、VB システムに過大な負荷がかかり、性能低下を招く。VKB47.com のみならず、店舗端末にも影響を及ぼす。

リスク発生の可能性：

バルテス・トラベル社では VKB47.com のサービス開始告知に力を入れており、キャンペーン価格のホテルも用意されていることから、サービス開始日は多くのアクセスが予想される。

ただし、サービス開始日以降は、旅行シーズンを外れている時期でもあるため、想定内のアクセス数に落ち着くものと思われる。

リスクへの事前対策：

VKB47.com にアクセスが殺到し、VB システムに影響が出る場合は、店舗業務を優先し、VKB47.com のサービスを停止することになっている。

情報の更新中に VKB47.com のサービスを停止しても、VB システムに影響が出ないことを確認しておく。

また、サービス停止中に表示される画面が適切（利用者に不快感を与えないこと。ホテル予約の代替方法として店舗の案内、電話予約サービスの案内があること）であることを確認する。

（3）英語ページの妥当性

リスク発生時の影響：

各国での利用者の満足度が低下し、本システムを通じた売上に影響する。

本システム品のみならず、当該地域での当社の信用度の失墜に繋がる。

リスク発生の可能性：

翻訳の専門スタッフを確保していないため、発生の可能性は高い。

リスクへの事前対策：

英語に堪能な技術者をテストリーダーにアサインする。

ホテル情報、客室情報以外の文章について翻訳会社に言語チェックを依頼する。
